



Programa Administración de Obra

OBR-P13.1. Matriz Análisis Grupos Interés

- Matriz Influencia Vs Poder

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
Descripción:	<p>Este proceso identifica a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.</p> <p>Las entradas, herramientas y técnicas y salidas que definen este proceso son los siguientes:</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #0056b3; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 30%; background-color: #0056b3; color: white;"> <p>Entradas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Acta de constitución del proyecto • 2. Documentos de las adquisiciones • 3. Factores ambientales de la empresa • 4. Activos de los procesos de la organización </div> <div style="border: 1px solid #0056b3; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 30%; background-color: #0056b3; color: white;"> <p>Herramientas y Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Análisis de interesados • 2. Juicio de expertos • 3. Reuniones </div> <div style="border: 1px solid #0056b3; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 30%; background-color: #0056b3; color: white;"> <p>Salidas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Registro de interesados </div> </div>				
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • identificar las personas, grupos u organizaciones que pueden impactar o ser impactadas por una decisión, actividad o una salida del proyecto; • analizar y documentar información relacionada con los intereses, compromiso, interdependencia, influencia e impacto potencial sobre el éxito del proyecto 				
Alcance:	La elaboración de la carta de obra compromete a las personas encargadas de administrar contratos y acuerdos firmados para llevar a cabo la obra junto a los responsables del equipo de trabajo encargados de implementar la obra.				
Responsables:	Establecer el equipo completo de trabajo en la obra, con sus respectivas responsabilidades.				
Definiciones:					

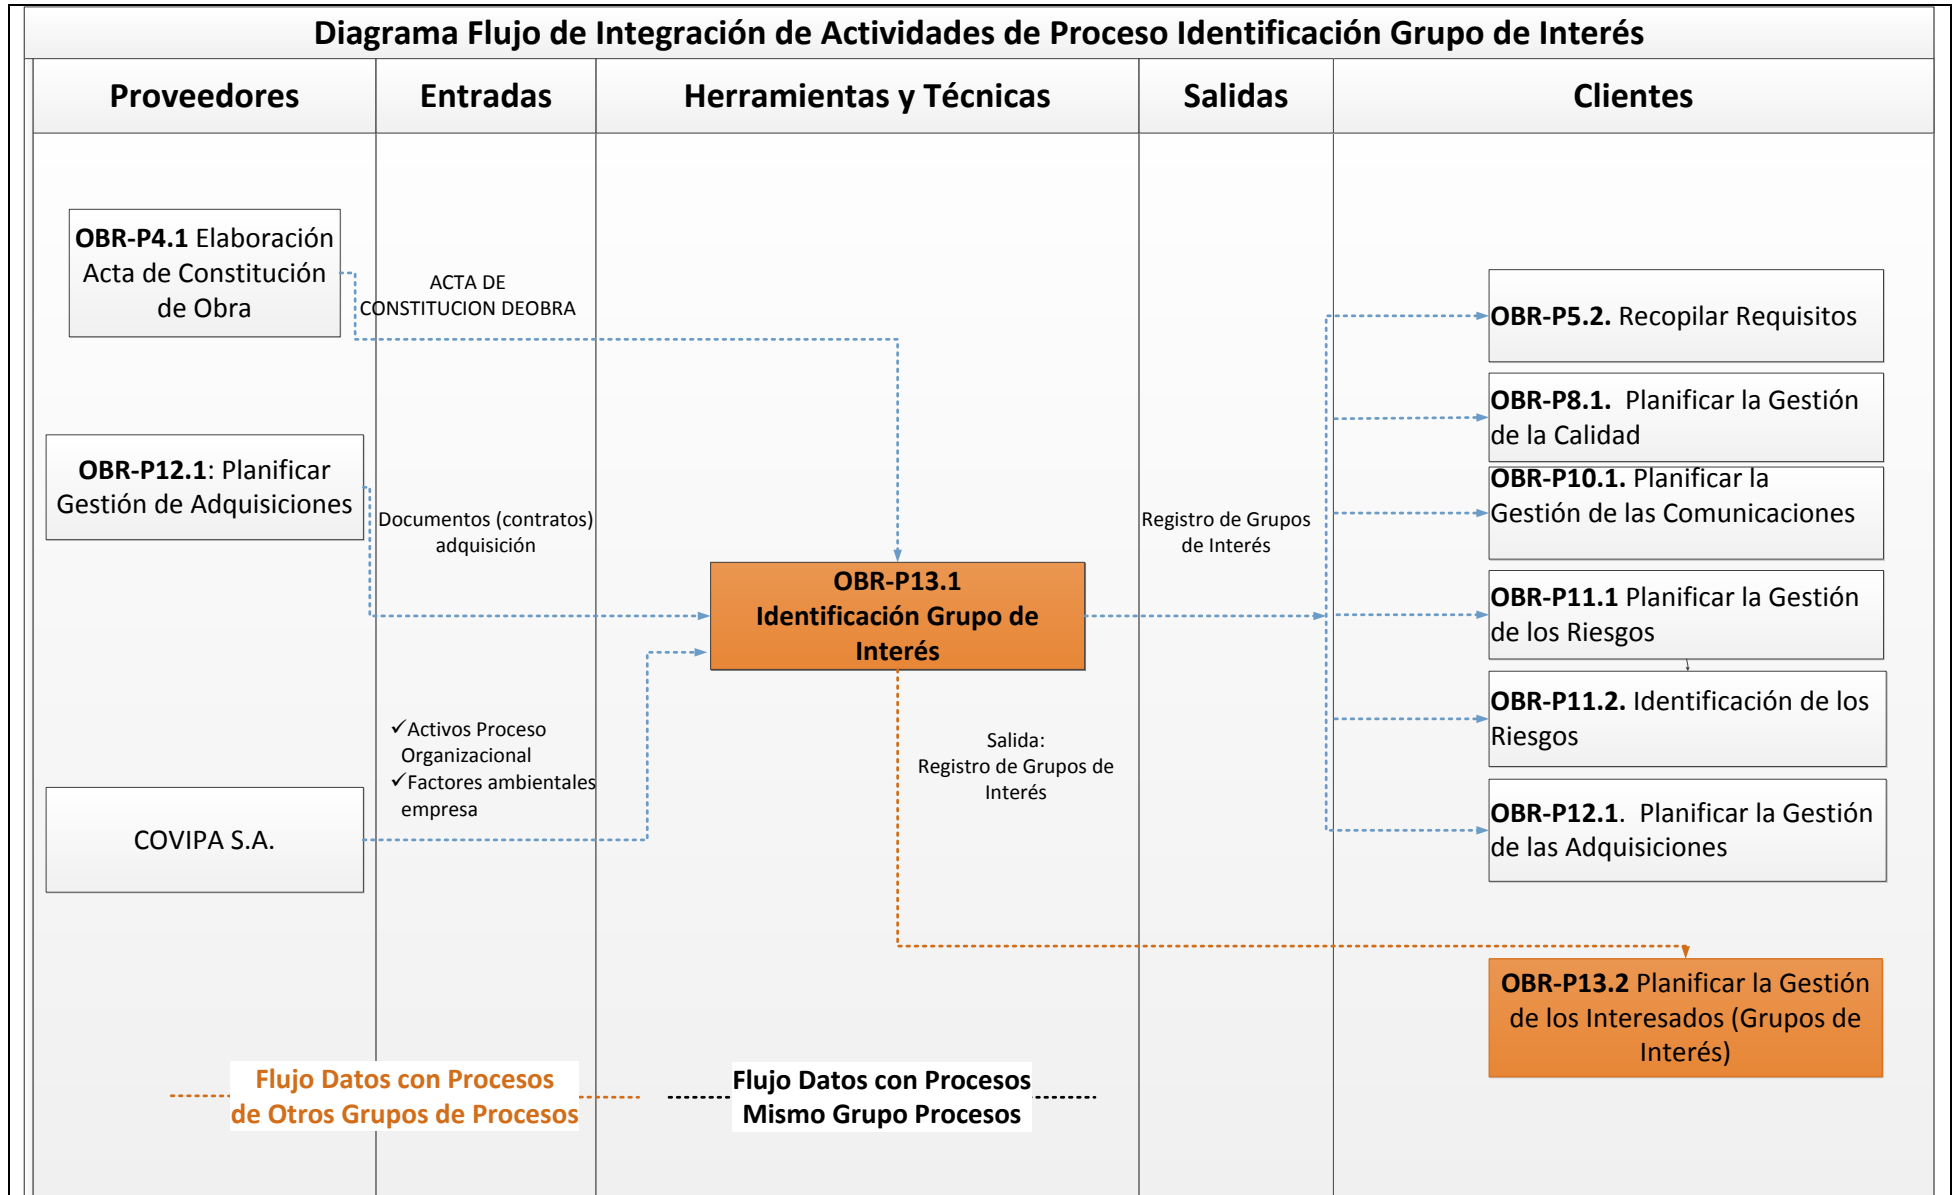

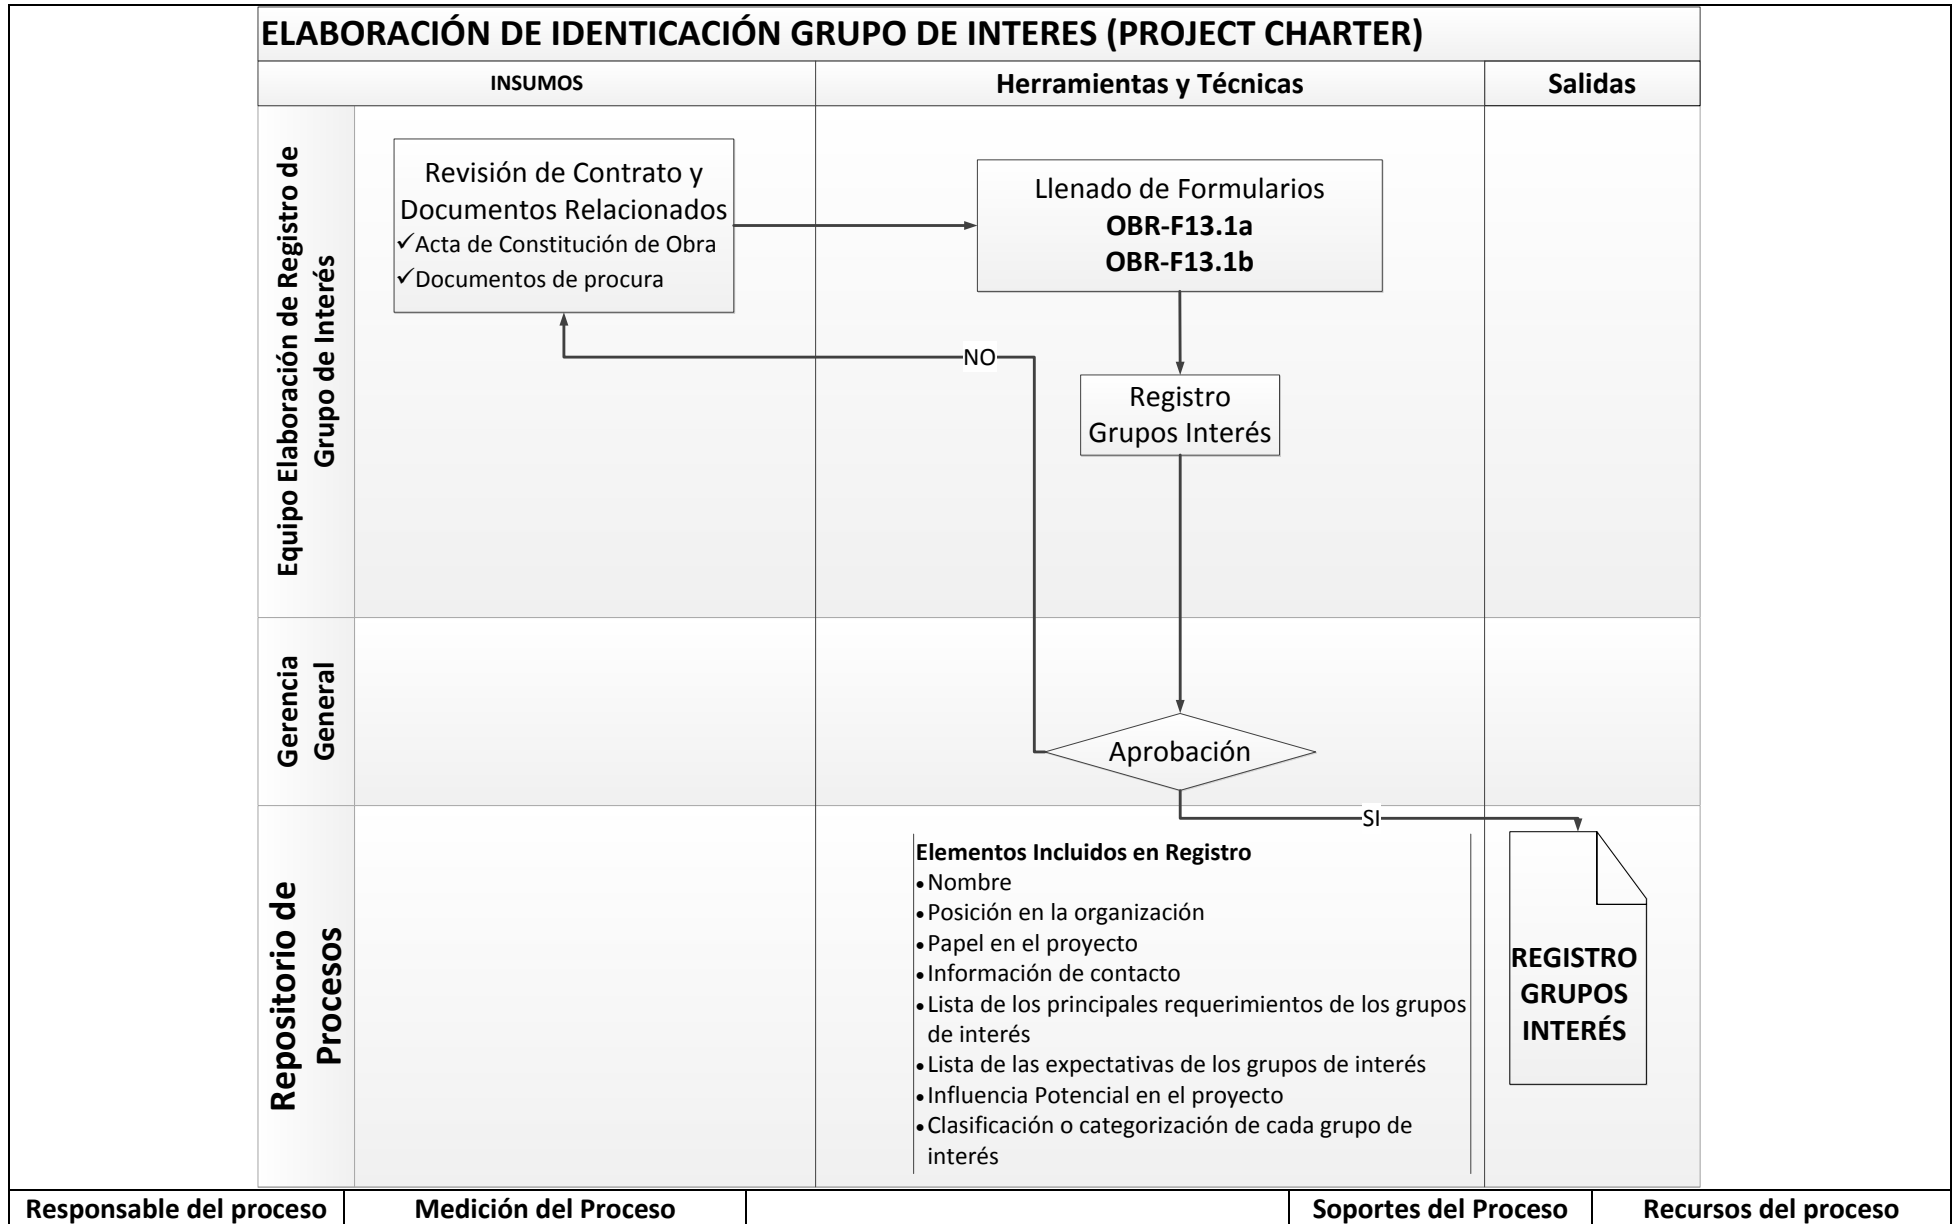

Programa Administración de Obra

OBR-P13.1. Matriz Análisis Grupos Interés

- Matriz Influencia Vs Poder

Ingeniero Responsable de Obra	Tiempo de salida y aprobación de Registro Grupo Interés		Formularios	
Participantes del Proceso	Mejoramiento del proceso			
Gerente Área Técnica Gabinete técnico Ingeniero Encargado de Obra Administrador de Obra	PDCA			
DOCUMENTOS DEL PROCESO				
Normatividad		Documentos operacionales		Registros
PMI				
