

Programa Administración de Procesos de Obra

OBR-P4.1 ACTA DE CONSTITUCION DE LA OBRA (PROJECT CHARTER)

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
Descripción:	Desarrollar el Acta de Constitución de la Obra es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de la obra la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.				
Objetivos:	<p>Los objetivos de este proceso son;</p> <ul style="list-style-type: none"> • establecer un inicio y definir bien los límites de la obra; • crear de un registro formal de la obra; y • establecer una forma directa para que la gerencia general acepte formalmente y se comprometa con la obra. <p>El Gráfico 4-2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Gráfico 4-3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso</p>				
Alcance:	<p>La elaboración del Acta de Constitución de la Obra compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • las personas encargadas de administrar contratos y acuerdos firmados para llevar a cabo la obra junto; y • a los principales responsables del equipo de trabajo encargados de implementar la obra. 				
Definiciones:					
Proveedores del Proceso	Entradas o insumos del Proceso	Herramientas y Técnicas	Salidas del Proceso	Clientes del proceso	
Contratante Contratista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato 2. Pliego de Base y Condiciones (PBC) 3. Activos Proceso Organizacional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juicio Experto 2. Técnicas de facilitación 	Acta de Constitución de la Obra	OBR-P4.2 OBR-P5.1 OBR-P5.2 OBR-P5.3 OBR-P6.1. OBR-P7.1. OBR-P11.1. OBR-P13.1.	
Responsable del proceso	Medición del Proceso		Soportes del Proceso	Recursos del proceso	
Ingeniero Responsable de Obra	Tiempo de salida y aprobación de Carta de Obra		Formularios		



Programa Administración de Procesos de Obra


OBR-P4.1 ACTA DE CONSTITUCION DE LA OBRA (PROJECT CHARTER)



Participantes del Proceso	Mejoramiento del proceso			
Gerente Área Técnica Gabinete técnico Ingeniero Encargado de Obra Administrador de Obra	PDCA			
DOCUMENTOS DEL PROCESO				
Normatividad		Documentos operacionales		Registros
PMI				

Programa Administración de Procesos de Obra

OBR-P4.1 ACTA DE CONSTITUCION DE LA OBRA (PROJECT CHARTER)

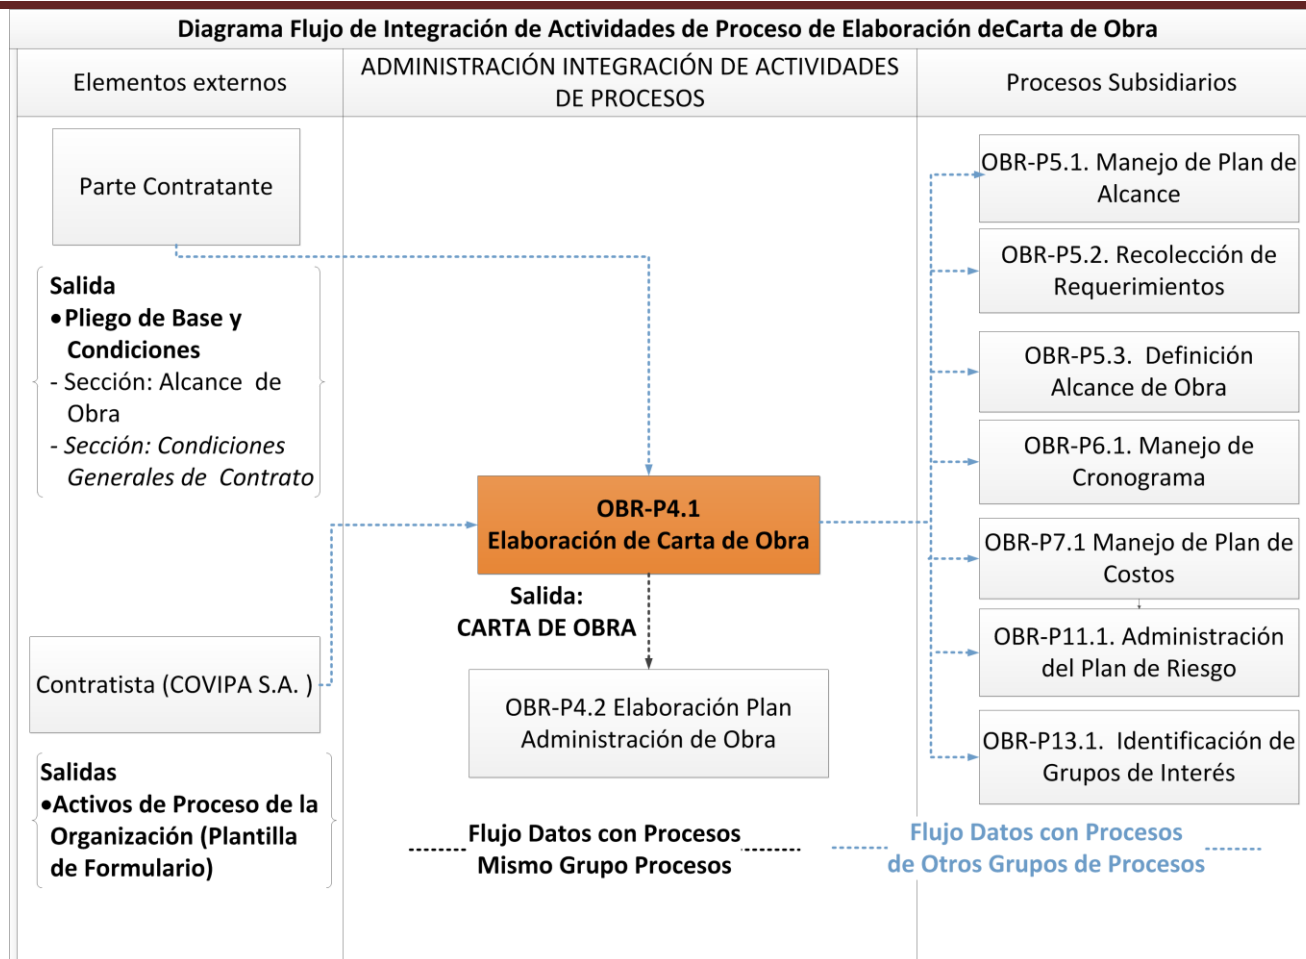



Programa Administración de Procesos de Obra

OBR-P4.1 ACTA DE CONSTITUCION DE LA OBRA (PROJECT CHARTER)



Programa Administración de Procesos de Obra

OBR-P4.1 ACTA DE CONSTITUCION DE LA OBRA (PROJECT CHARTER)

